

*Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan
sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu
termasuk hal-hal yang diutamakan
(Asy-Syūrā 42 : 43)*

*Kupersembahkan untuk bapak, mamah
Dan semua orang yang kusayangi*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Schedule Pendatangan Material dan Standby Alat Berat

Lampiran 2 Schedule Pendetangan Material Besi Beton

Lampiran 3 Formulir Surat Permintaan Pembelian (SPP)

Lampiran 4 Formulir Seleksi dan Negosiasi Produsen/Kontak Agen

Lampiran 5 Formulir Daftak Induk Produsen dan Kontak Agen Terseleksi

Lampiran 6 Daftar Nama Produsen/Kontak Agen

Lampiran 7 Formulir Surat Pesanan (SP)

Lampiran 8 Formulir Konfirmasi Pesanan

Lampiran 9 Surat Perintah Kerja Angkutan

Lampiran 10 Surat Tanda Terima Penyerahan Barang

Lampiran 11 Contoh Surat Jalan Dari Supplier

Lampiran 12 Form Cap Untuk Penerimaan Barang Langsung

Lampiran 13 Formulir bon penerimaan gudang (BPG)

Lampiran 14 Contoh Pengisian Berita Acara Serah Terima Barang

Lampiran 15 Contoh Pengisian Kartu Stock Harian

Lampiran 16 Denah Gudang Tertutup

Lampiran 17 Ruang Kerja Besi dan Kayu

Lampiran 18 Contoh Pengisian Bon Permintaan dan Pengeluaran Barang

Lampiran 19 Contoh Surat Permohonan MDVO Kepada MDVK

Lampiran 20 Contoh Daftar Nama Proyek Yang Membutuhkan

Lampiran 21 Form Permintaan SKDBN Ke Bank

Lampiran 22 Contoh Stempel Untuk Evaluasi Produsen / Kontak Agen

Lampiran 23 Rekap Hasil Evaluasi Produsen/Kontak Agen

Lampiran 24 Stempel Untuk Evaluasi Sub Kontraktor

Lampiran 25 Rekap Hasil Evaluasi Sub Kontraktor

Lampiran 26 Daftar Kegiatan Yang Terlambat Direalisasikan

Pionirbeton
PT. PIONIRBETON INDUSTRI
 Level 15 Wisma Indocementi Kav. 70-71 Jl. Jend. Sudirman Jakarta 12910
 Phone : (62-21) 2512121 ext. 3551, 3552 Fax : (62-21) 2512130
 Operational / Marketing Phone : (62-21) 84590836 -39
 Fax. 8448207, 84596613, 84594322

6

CUSTOMER'S COPY

Date Tgl. 12 Oct 04
 Deliver to Proyek ITB KAMPUS CENTER JALAN
 For untuk PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN

D/O No. (No. Docket) : 6015259

MASUK

Mix Mutu	Slump	Total ordered Volume total	Progressive Total Vol. Kumulatif	This Load Vol. Truk
ITB30R10				6.00
Mix Deso: K-300 131 2 FOSFOC				
EXTRAS				
Truck No. No. Truk	Time ex Plant Jam Keluar Plant	Time in Plant Jam Masuk Plant		

See Over (Syarat Penjualan tercantum pada belakang docket ini)
 Signature (Tanda tangan):

jkm kba 27 00

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNIT/PROYEK/KAMPUS CENTER ITB PENERIMAAN BARANG		
KEDATANGAN	DIPERIKSA	DITERIMA
(.....)	(.....)	(.....)
TGL. 29/10/04	TGL. 29/10/04	TGL. 29/10/04
JAM. 10:00	JAM. 10:00	JAM. 10:00

Surat Jalan

CV. SINAR TERANG
 Jl. Lengkong Kecil No. 61 A, Bandung, 40261
 Jawa Barat - Indonesia
 Tel/Fax: (022)4236406, 4219296 / (022)4206350

Kepada:
PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
Proyek Kampus Center ITB


#Faktur: FKJ/20050429.0001




No.	Nama Barang (1)	Jml. Barang	Keterangan
1.	WIRE MESS M5	14,00 LBR	

Bandung, 29 April 2005

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNIT/PROYEK/KAMPUS CENTER ITB PENERIMAAN BARANG	
KEDATANGAN	DIPERIKSA
(.....)	(.....)
TGL. 29/10/04	TGL. 29/10/04
JAM. 10:00	JAM. 10:00

(g)Trafost Pro v1.00

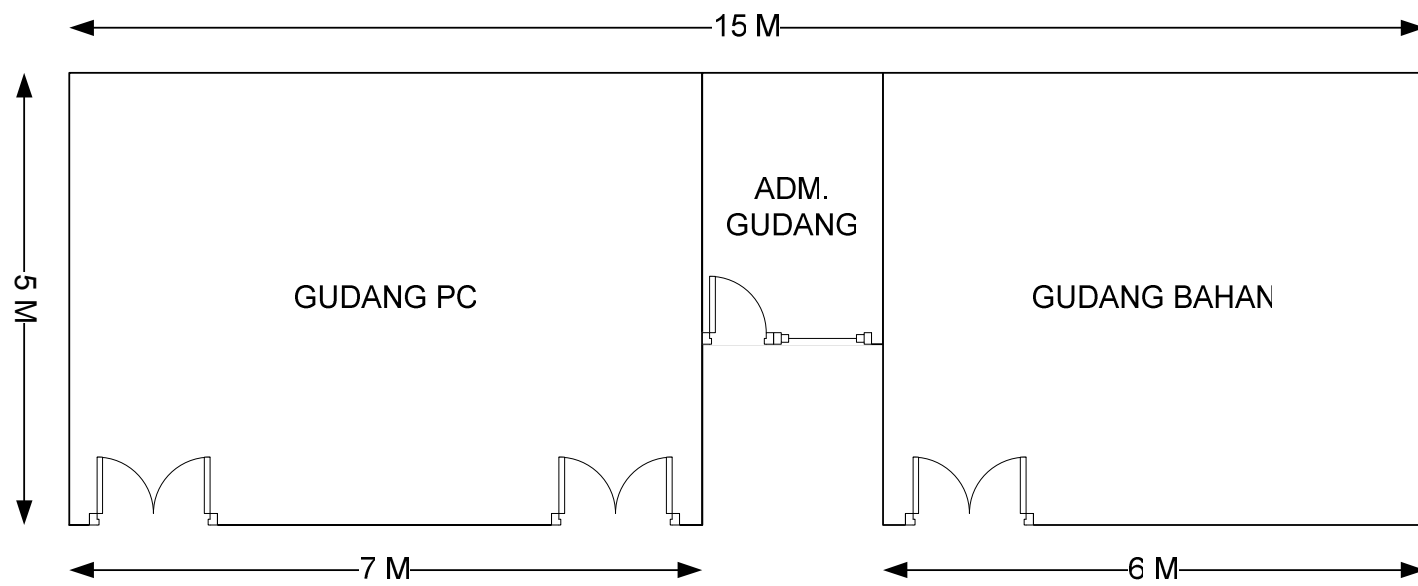

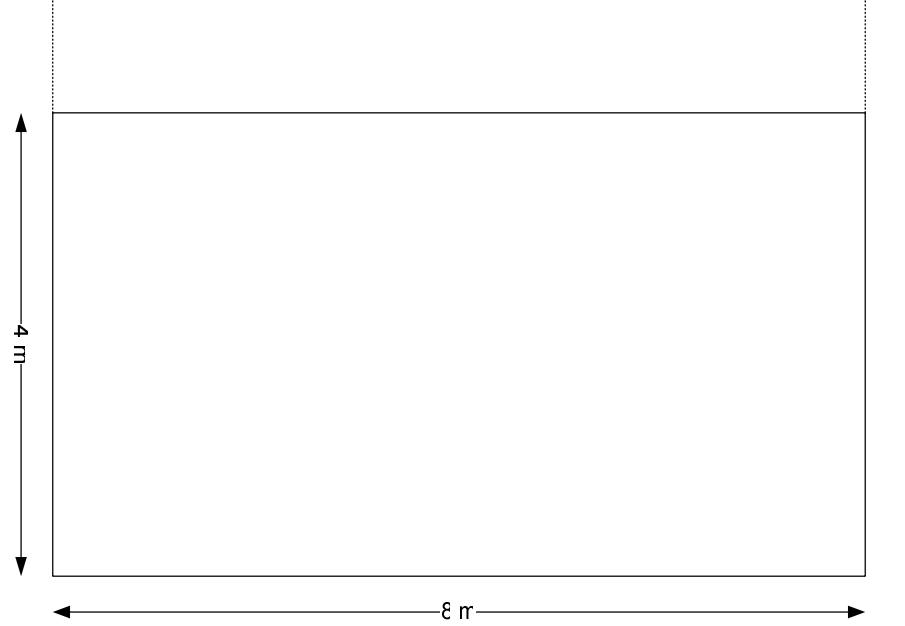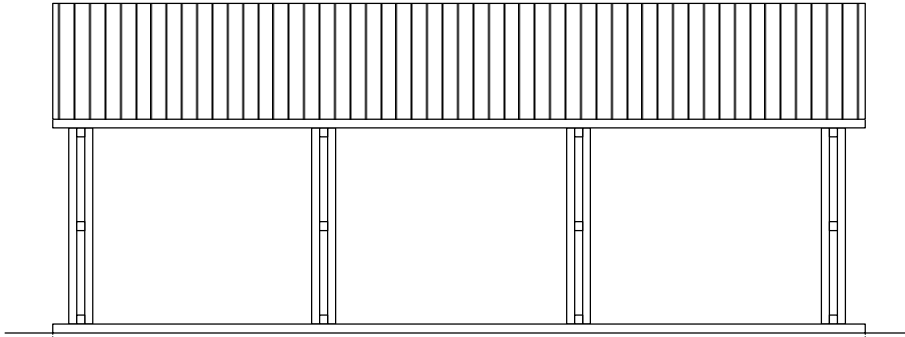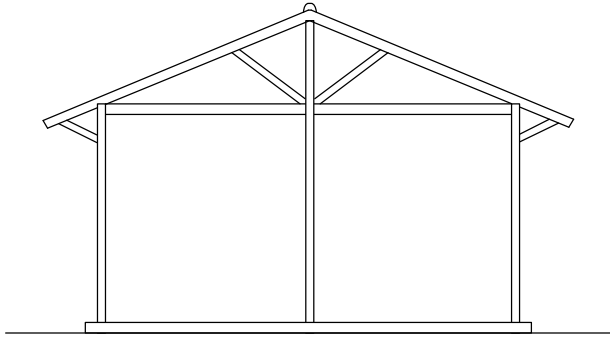

Lamp.3
Q-2000/ PMT/ AD/ W/ 003

PERMINTAAN PEMBUKAAN SKBDN

Diisi oleh Bank

Kepada Yth
Hub Manager PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Jakarta Pasar Rebo.....

1.	Reg. Bank No.	:	
	Tanggal	:	
2.	Bank Penerima	:	
3.	SKBDN No	:	
4.	Teleks / Swift	:	
	Surat	Tanggal	
		Paraf	

Dengan ini diharapkan supaya Sdr. Membuka SKBDN menurut petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

5. SKBDN dibuka melalui Bank Penerima Nama : **Bank Danamon, Alamat Jln. Daan Mogot no. 48 Tangerang**
 6. Jenis SKBDN : atas unjuk / **akseptasi** / negosiasi / transferable*)
 7. Cara membuka : dengan surat (pos udara) teleks/**swift***) selambat-lambatnya **5 Juni 2003**.....
 8. a. Berlaku sampai dengan (expiration) : tanggal **4 Juli 2003**.....
b. Tgl. Pengapalan Terakhir **15 Juni 2003**.....
 9. Untuk penerima :
 - Nama : **PT Inter World Steel Mills Indonesia**
 - Alamat : **Jln.Pangeran Jayakarta, Blok 131 No.44-45 Jakarta**
 10. Atas penyerahan wesel unjuk (sight drafts) **wesel berjangka (usance drafts)** *) yang ditarik atas Sdr. Untuk sejumlah **100% dari faktur dan akan jatuh tempo 30 hr setelah Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh MDVO PT PP (Persero) dengan Pihak Supplier** dan wajib disertai :
 - a. Faktur yang ditandatangani rangkap.
 - b. Seperangkat lengkap dokumen pengangkutan berupa
 - Bill of lading "On board" yang "bersih" (clean On Board B/L) kepada order Sdr.
 - Dokumen pengangkutan udara (air Waybill)
 - Dokumen pengangkutan darat, kereta api atau jalan air dalam negeri (Road, Rail or Inland Waterway Transport Document)
- Dokumen lainnya
- **Kuitansi bermeterai yg ditanda tangani Penjual dalam 1 Asli & 2 Copy**.....
 - **Faktur Pajak Standard dalam 3 Copy**.....
 - **Surat jalan dalam 1 Asli 2 Copy yg ditanda tangani staf masing-2 Proyek PT PP (Persero)**

- **MILL Certificate dalam 1 Copy**
- **Berita Acara Pembayaran yg ditanda tangani MDVO PT PP (Persero) dan PT Inter World Steel mills Indonesia**

11. Contract / Order No. : **Terlampir**

12. Uraian barang (wajib dicantumkan dalam SKBDN yaitu huruf a, b, c, d, e, f dan g dibawah ibi) :

- a. Nama barang : **Besi Beton**
- b. Jenis barang : **Besi Beton**
- c. Mutu barang : **BJTP 24 dan BJTD 40**
- d. Volume barang : **1.288.466 Kg**
- e. Harga satuan
- g. Biaya pengiriman
- i. No. Pos tariff (HS)

- f. Harga total
- h. Harga sampai ditempat **Rp. 3.910.109.600,-**

13. Dikirim / dikapalkan dari : **Tangerang**

15. Pengiriman sebagian (Part Shipment)

16. Transhipment

17. Asuransi

14. Tempat / Pelabuhan tujuan : **Jakarta dan Padalarang**

: **diperkenankan** / tidak diperkenankan *)

: **diperkenankan** / tidak diperkenankan *)

: a. Ditutup pada

b. Kondisi

c. Nilai pertanggungan : **Rp. 3.910.109.600,-**

18. Tanggal batas waktu penyerahan dokumen :

19. Tempat penyerahan dokumen :

20. Pemohon:

a. Nama : **PT Pembangunan Perumahan (Persero)**

b. Alamat : **Jl.Letjend.TB.Simatupang 57 Ps.Rebo Jakarta 1376012**

c. NPWP : **01.001.613.7 – 051.000**

d. Telp. No. : **8403912**

Kami menyatakan bahwa terhadap pembukaan SKBDN tersebut di atas akan berlaku Syarat-syarat Umum Bank saudara untuk pembukaan SKBDN, serta SK Dir. BI No. 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 dan segala biaya yang timbul karena SKBDN ini menjadi beban kami.

FASILITAS UKPN		
NO.	TGL.	SETORJAM%

Jakarta., 2 Juni 2003.....

(Cap Perusahaan)

Coret apa yang tidak diperlukan *)

Gambar 2.3 Contoh laporan penerimaan material [1]

LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL (LPM)

No. LPM : _____

HAL : _____ DARI : _____

PESANAN INI ADALAH :
 LENGKAP
 TIDAK LENGKAP
 DITERIMA RUSAK

NO. PRINT. PEMB : _____

NO. PERMINTAAN : _____

TANGGAL DITERIMA : _____

DIPESAN DARI : _____

DIKAPALKNA OLEH : _____

DIKIRIM KEPADA : _____ NO.SLIP KEMASAN : _____

MELALUI : _____ TITIK F.O.B : _____

PERUS. PENGANGKUT	
SURAT PENGANGKUTAN	NO.
SURAT KILAT	BRT.
PAKET POS	TGL.
PEMB. DI MUKA	BERAPA Rp.
DITAGIH	BERAPA Rp.
KERETA API	
NO.TRUK	
NO. DOK	

NO. POS BARANG PTH PMBL.	KUANTITAS	SAT	URAIAN	LOKASI	NO.PERK

NO.GMR. _____ DISERAHKAN KEPADA _____

NO. B M _____ DIPERIKSA OLEH _____

PEMRAKARSA PERMINT. PEMB. _____ INSPK. PERGUDANGAN _____

Schedule Material

Pekerjaan	Material	Spesifikasi	Volume	Target Waktu			Ket
				Pengajuan	Approve	Datang	
Pasangan	Celcon Bata Merah Canal C Roster Cipta Mortar Glass Block	Jaya Celcon					
Pengecatan	Cat Interior Cat Exterior Cat Plafond Cat Pintu Kayu						
Finish Lantai	Keramik 20x20 Lantai Keramik 20x25 Dinding Keramik 40x40 Lantai Perekat Keramik Grouting Nad Keramik Waterproofing Membrane Waterproofing Coating Flex						
Kusen Pintu & Jendela	Kaca Kusen Kayu / Alm Partisi Tripleks 6mm (prts) Handle Pintu						
Alat Penggantung & Kunci	Handle Pintu Engsel pintu Engsel Jendela Hak Angin Gerendel Jendela						
Landscape	Lampu Taman Rumput Cansteen Paving Block Pos Jaga						
Railing	BSP						
Dainase	Grill Batu Kali						
Sanitari	Closet Jongkok Closet Duduk Urinoir Wastafel Kran Shower Dinding						
Langit - Langit	Tripleks 6mm Rangka Kayu List Plafon						
Mekanikal Elektrikal							
Penerangan & Stop Kontak	Saklar lampu Stop Kontak Box Panel MCB dll Kabel 2 Armatur Lampu						
Instalasi Penangkal Petir	Splitsen Kabel BC Klem						
Air Bersih & Kotor	Pipa PVC FD CO Kran						
Pencegah Kebakaran	Fire Alarm Smoke/Heat Detector Bell Manual Push Button MDF Kabel2 Fire Extinguisher Hydrant Box BSP (Sch 40)						
Sound System	Central Sound System 240 W IDF lengkap Ceilling Speaker Horn Speaker Volume Control Terminal Box						
Telepon	PABX lengkap 10PTT/ 50Ext MDF						
Instalasi Komputer	Kabel UTP RJ 45						

**SCHEDULE PENDATANGAN MATERIAL BESI BETON
PROYEK CAMPUS CENTER**

NO	URAIAN	SAT	KEBUTUHAN		JADWAL PENDATANGAN				KET
			BTG	KG	24-25 SEPT 2004	28-29 SEPT 2004	4-5 OKT 2004	8-9 OKT 2004	
I BESI BETON POLOS									
1	Ø 8mm - 12 m	Btg	5.552,00	26.316,48	5.000,00	552,00			
					23.680,00	2.636,48			
2	Ø 10 mm - 12 m	Btg	2.104,00	15.569,60	2.104,00				
					15.569,60				
II BESI BETON ULIR									
1	D13 mm - 12 m	Btg	5.788,00	72.384,73	860,00	928,00	100,00	3.900,00	
					10.755,16	11.605,57	1.250,60	48.773,40	
2	D16 mm - 12 m	Btg	4.018,00	76.181,28		425,00	2.592,00	101,00	
						8.058,00	49.144,32	18.978,96	
3	D19 mm - 12 m	Btg	659,00	17.634,84		659,00			
						17.634,84			
4	D22 mm - 12 m	Btg	277,00	9.905,52		277,00			
						9.905,52			
JUMLAH DALAM KG			217.992,45	50.004,76	50.004,76	49.840,41	50.394,92	67.752,36	

Mengetahui,

Bandung, 15 September 2004
Dibuat oleh :

Husen
SEM

Asep Budiana
SOM

Asep Juhdi
SP

**FORM CAP UNTUK PENERIMAAN
BARANG LANGSUNG**

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN
UNIT / PROYEK :

Page 1
PENERIMAAN BARANG

KEDATANGAN	DIPERIKSA	DITERIMA
(.....)	(.....)	(.....)
JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :
Tgl :	Tgl :	Tgl :
Jam :	Jam :	Jam :

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Pesero)



BON PENERIMAAN GUDANG (BPG)

PEMBELIAN / TRANSFER

DIVISI OPERAS : II

CABANG : IV

PROYEK : CAMPUS CENTER ITB

BULAN : Jan/ TAHUN : 2005

KODE PROYEK : 230406

NAMA SUPPLIER : CV MEGAH SELATAN

MODUL IC - RECEIPT

KODE SUPPLIER :

TGL. TRANSAKSI	NO. BUKTI
12/01/2005	230406 PG 0171

NO.	KODE RES	NAMA BARANG	KODE BARANG	VOLUME	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1		KERAMIK 20 X 20.Cm (223001)		155,00	Box			SPP : 057
2		KERAMIK 20 X 25.Cm (W.25107)		96,00	Box			PO : 087
JUMLAH RUPIAH D= K							0,00	

TERBILANG : TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH.

No. Bat	No. Urut	Tanggal Transaksi	Tanggal Tutup Buku	No. Bukti	Kode Perkiraan	Kode Proyek	Keterangan
		12/01/2005	29/01/2005		(D).....		-
					(K).....		

DISETUJUI OLEH SEM	DIBUAT OLEH PETUGAS GUDANG
(HUSEN)	(MARSINO)

EVALUASI (diisi oleh SEM)

- Pencapaian Volume & Waktu Pengiriman
- Kriteria Penerimaan Ilus (d) > 65%
- Kesimpulan

Lembar 1 : KBA DVO Lembar 2 : Untuk arsip proyek Lembar 3 : Untuk petugas gud	a. Pengiriman ke :	<input type="text"/>	Kontak Agen/ Produsen Lulus
	b. Target (sesuai SP) :	<input type="text"/>	Evaluasi
	c. Realisasi :	<input type="text"/>	Kontak Agen/ Produsen tidak
	d. Evaluasi (c/bx100%) :	<input type="text"/>	Lulus Evaluasi

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)
CABANG IV JAWA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 017/BASTAK/PP.CC-ITB/XIV/2005

Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **SATU** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU LIMA**, telah ditanda tangani bersama Berita Acara Serah Terima Barang antara :

1. PT Pembangunan Perumahan : **Proyek Campus Center ITB Bandung** (Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama).
2. **Bpk. Kusrandi Bandung** (Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua).

Dengan ini pihak pertama telah menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dari Pihak Pertama dengan data - data sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	MERK	UKURAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	BESI BEKAS TERMINAL DLL	-	Fariasi	1,00 Truk	Baik	Diangkut dengan kendaraan Truk D.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3(tiga), asli agar dikembalikan ke Proyek Campus Center ITB Bandung

Menyetujui,

Husen
SEM

Yang menerima,

(.....)

Yang menerima

(.....)
Epedisi / Supir

Bandung, 01 April 2005
Yang menyerahkan,

Marsino
Pembelian

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)
CABANG IV JAWA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA ALAT / KENDARAAN

Nomor : 061/BASTAK/PP.CC-ITB/III/2005

Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **SATU** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU LIMA** telah ditandatangani bersama Berita Acara Serah Terima Alat / Kendaraan antara :

1. PT Pembangunan Perumahan : **Proyek Campus Center ITB Bandung** (Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama).
2. PT Pembangunan Perumahan : **HERITAGE Bandung**(Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua).

Dengan ini pihak pertama telah menyerahkan Alat / Kendaraan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima alat / Kendaraan tersebut dari Pihak Pertama dengan data - data sebagai berikut :

No	JENIS ALAT/KENDARAAN	MERK	TYPE / NOMOR	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	SAFETY NET KAWAT	-	-	6,00 Pcs	Baik	Diangkut kendaraan Nopol. D.

Barang - barang tersebut diatas telah dihitung bersama antara Bagian Peralatan Proyek dan Bagian Expedisi (Pengemudi) dan telah dinyatakan - bahwa barang - barang tersebut diatas adalah benar.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (Tiga) untuk kedua belah pihak.

Mengetahui,
Pihak Pertama

(**HUSEN**)
SEM

Mengetahui,
Pihak Kedua

(.....)
Proyek Heritage

Yang menerima,

(.....)
Epedisi / Sopir

Bandung, 01 April 2005
Yang menyerahkan,

Marsino
Pembelian

PT PP (Persero)

BON PERMINTAAN DAN PENGELUARAN BARANG

CABANG IV

BPPB

PROYEK : CAMPUS CENTER ITB BANDUNG

NO. BPPB : **0682**

CABANG : IV JAWA BARAT

DVO

PROYEK

DIVISI OP : II

II**IV****2****3****0****4****0****6**

NO.	KODE LOK	KODE RESC	AKTIVITAS (JENIS PEKERJAAN)	BARANG		VOLUME	
				NAMA	ASAL	PERMINTAAN	REALISASI
1			Pengecoran kolom konekting & rem	Beton Jadi K - 300	PT. Pionir	2,50 M3	2,50 M3
DITERIMA TGL : 03/03/2005			DIKELUARKAN TGL : 03/03/2005		PERMINTAAN TGL : 03/03/2005		
OLEH			OLEH		DIBUAT OLEH		
Marsino			SUB URUSAN GUDANG		SOM		
Marsino			NAMA TERANG		DIBUAT OLEH		
Masidin			Masino		PELAKSANA		
			NAMA TERANG		NAMA TERANG		
			Masidin		Agus Kurniawan		
					Masidin		

PT PP (PERSERO)**DIVISI OPERASI II**

Jl. . TB . SIMATUPANG NO 57 PASAR REBO
 JAKARTA 13760
 TEL : (021)8403883 FAX : (021) 8403890

MEMORANDUM

No. : 41/M/DVO II/V/2003
 Tanggal/Date : 21 Mei 2003

Kepada/To

Dari/Form : MDVO II

MDVKHal : **Penerbitan SKBDN**

Dengan hormat,

Mohon dapat diterbitkan SKBDN dengan data sebagai berikut :

- 1 Ditujukan kepada : PT. INTER-WORLD STEEL MILLS INDONESIA
- 2 Peruntukan : Pembelian besi beton mutu BJTP 24 & BJTD 40
- 3 Berdasarkan : - PO No.06, Tgl. 04/02/03
- PO No.09, Tgl. 10/02/03
- 4 Tujuan Pengiriman : 1. Proy.Jl.Tol Padalarang,Padalarang
2. Proy.Mega Kuningan, Jakarta
- 5 Tgl.terakhir penerimaan : 15 Juni 2003
- 6 Tanggal penerbitan : 26 Mei 2003
- 7 Masa berlaku : s / d 30 Juni 2003
- 8 Sifat SKBDN : Akseptasi
- 9 Dokumen yg harus dilampirkan : - Kuitansi yg ditanda tangani Penjual dlm 1 Asli & 2 Copy
- Faktur Pajak Standard dlm 3 Copy
- Surat Jalan dlm 1 Asli & 2 Copy yg ditanda tangani pengirim dan penerima barang di Proyek.
- Mill Certificate dalam 1 Copy
- Berita Acara Pembayaran yg di tanda tangani MDVO dengan pihak supplier
- 10 Nilai SKBDN : Rp. 3.910.109.600,- (Tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- 11 Pembayaran : Dilaksanakan min. 30 hari setelah Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Lampiran : - Rencana SKBDN

Herbiyantoro**KOLOM PERSETUJUAN**

No.	Pejabat	Ok (*)	N' Ok (*)	Paraf	CATATAN
1	MDVK				
2	ADO				
3	DO				
4	DK				
5	DU				

(*) : beri tanda v

Lampiran Surat Permohonan Pembukaan SKBDN
No.

RENCANA SKBDN BESI BÉTON
BULAN MEI 2003

No.	PROYEK	VOLUME (Kg)	NILAI SKBDN (Rp)
	<u>CABANG IV</u>		
1	Proyek Tol Padalarang	840.466	2.572.829.600
	<u>CABANG III</u>		
1	Proyek Mega Kuningan	448.000	1.337.280.000
	JUMLAH	1.288.466	3.910.109.600

Evaluasi (diisi oleh SEM)

1 Pencapaian Volume & Waktu Pengiriman

- a. Pengiriman ke :
 b. Target (sesuai SP) : pcs (vol & jadual)
 c. Realisasi : pcs
 d. Evaluasi $\frac{c}{b} \times 100\%$: X 100% = %

2 Kriteria Penerimaan lulus (d) > %

- 3 Kesimpulan :** Kontak Agen / Produsen Lulus Evaluasi
 Kontak Agen /Produsen Tidak Lulus Evaluasi

Kepada Yth. : KBT

Lampiran.2
VI No. Q-2000/PMT/ AG/VW 004

REKAP Evaluasi Produsen / Kontak Agen

I DIVISI OPERASI : III
II CABANG : VII
III PROYEK : Irigasi

IV Nama Prod/ K.Agen : PT Adi Daya Guna

V No Kode : 025 / DO.II/ 001 (sesuai yang tercantum dalamDaftar Induk Produsen/ Kontak Agen)

VI Rekapitulasi BPG :

No. Rec : / 9.2/Q-2000/ PMT/ AG/VW 004

Nama/ Jenis Barang	Jumlah BPG	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Periode Evaluasi
PC Type.I	35	32	3	Pebruari s/d Juli 2000
		Diketahui oleh		Dibuat oleh
		SEM	PM	PETUGAS GUDANG
		Seto	Arif	Rosma
	tgl.		

Evaluasi (diisi oleh SEM) :

1 Pencapaian waktu & kualitas :

- $\frac{\text{Prestasi Physik Bulan ini}}{\text{Rencana Prestasi Bulan ini}} = \text{.....} \times 100 \% = \text{.....} \%$

2 Kriteria Penerimaan : > %

3 Kesimpulan : Sub Kontr. Lulus Evaluasi

Sub Kontr. Tidak Lulus Evaluasi

Kepada Yth. : KBT

Lampiran.4
WI No. Q-2000/PMT/AG/WI/004

REKAP Evaluasi Sub Kontraktor

I DIVISI OPERASI : III

II CABANG : VII

III PROYEK : Irigasi

IV Nama Prod/ K.Agen : PT Setia Mitra

V No Kode : 072/ Sub/DO2/01 (sesuai yang tercantum dalam Daftar Induk Produsen/ Kontak Agen)

contoh

VI Rekapitulasi BPG :

No. Rec : / 9.2/Q-2000/ PMT/ AG/ WI/ 004

Nama/ Jenis Pekerjaan	Jumlah LPS	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Periode Evaluasi
Pengadaan dan pemasangan plafond gypsum	3	3		Sep s/d Nov 2001
			Diketahui oleh PM	Dibuat oleh SEM
			Sumardi	Sidik
		 tgl	
