

Tabel 4.1 Peta Kebutuhan Tenaga Kerja

Jenis Pekerjaan	Agustus				
	Minggu ke				
	1	2	3	4	1
Pek. Galian					
Galian sumuran		114	114	114	
Galian DPT		90	30		
Galian pilecap, footplate, sloop			60	60	
Galian bak sumpit dan saluran basement			64	96	32
Pek Pondasi					
Pembesian sumuran			176	352	
Cor sumuran				761	
Pembesian pilecap, footplate, sloop dan DPT				97	582
Bekisting bata pilecap, footplate, sloop dan DPT					
Pembesian bak sumpit					14
Bekisting bak sumpit dan saluran basement					66
Cor baksumpit, saluran basement, pilecap, footplate, sloop dan DPT					
Pek basement					
Lantai kerja					2082
Pembesian lantai basement					378
Cor lantai basement					
Pembesian kolom basement					
Bekisting kolom basement					
Cor kolom basement					
Pek lantai 1					
Bekisting pelat dan balok					
Pembesian sloop					
Bekisting sloop					
Pembesian pelat dan balok					
Cor pelat, balok & sloop					
Pembesian kolom					
Bekisting kolom					
Bekisting tangga					
Pembesian tangga					
Cor kolom & tangga					
Pek lantai 2					
Bekisting pelat dan balok					
Besi pelat dan balok					
Cor pelat dan balok					
Besi kolom					
Bekisting kolom					
Bekisting tangga					
Pembesian tangga					
Cor kolom dan tangga					
Pek lantai3					
Bekisting pelat dan balok					
Besi pelat dan balok					
Cor pelat dan balok					
Besi kolom					
Bekisting kolom					
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (orang-minggu) (1)	0	204	444	1480	3154

Tabel 4.1 Peta Kebutuhan Tenaga Kerja

Jenis Pekerjaan	Agustus				
	Minggu ke				
	1	2	3	4	1
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (orang-minggu) (1)	0	204	444	1480	3154
Pek lantai3					
Bekisting tangga					
Pembesian tangga					
Cor kolom dan tangga					
Pek lantai4					
Bekisting pelat dan balok					
Besi pelat dan balok					
Cor pelat dan balok					
Besi kolom					
Bekisting kolom					
Bekisting tangga					
Pembesian tangga					
Cor kolom dan tangga					
Pek lantai5					
Bekisting pelat dan balok					
Besi pelat dan balok					
Cor pelat dan balok					
Besi kolom					
Bekisting kolom					
Bekisting tangga					
Pembesian tangga					
Cor kolom dan tangga					
Pek dak					
Bekisting pelat dan balok					
Besi pelat dan balok					
Cor pelat dan balok					
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (orang-minggu)		204	444	1480	3154

September			Oktober				November			Desember					
Minggu ke			Minggu ke				Minggu ke			Minggu ke					
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1189	2094	1093	929	1137	1399	882	882	0	0	1093	951	744	744	1024	
								L I B U R A R A N							
															28
															26
															192
															198
1189	2094	1093	929	1137	1399	882	882		0	0	1093	951	744	744	1468


Lembar 2 dari 2

Januari				Februari				Maret			
Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13											
83											
288	288	96									
594	594	198									
		575									
			208	208							
			96	120							
			28								
				39							
				91							
				264	264	264					
				184	552	552	184				
							536				
							124	155			
							54	90			
							28				
								39			
								43			
								276	276		
										558	465
											520
1249	882	869	332	906	816	816	926	603	276	558	985

Tabel 4.2 Peta Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Keterampilan

Jenis Keterampilan	Agustus				September				Oktober		
	Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Tk. Gali		186	242	244	28						
Mandor		18	40	64	96	85	73	82	72	76	104
Tk besi 1/2 terampil			92	235	510	588	429	306	330	303	406
Tk. besi terampil			42	107	232	266	194	138	149	136	180
Kep tk besi			28	72	158	182	133	96	104	96	128
Pekerja				664	1634		793	148	59	245	203
Kep tk batu				27	42	2	43	3		7	4
Tk batu 1/2 terampil				67	408	24	199	22		18	34
Pekerja 1/2 terampil						42	210				
Tk kayu terampil					16		7	107	78	92	119
Kep tk kayu					16		7	107	78	92	119
Tk kayu 1/2 terampil					14		6	84	59	72	102
Total (orang-minggu)		204	444	1480	3154	1189	2094	1093	929	1137	1399

Keterangan:


Libur Lebaran = 

	November				Desember				Januari				Febr	
	Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Ming	
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
72	72			50	75	60	60	82	99	72	26	28	68	66
312	312			212	249	264	264	316	385	312	104	108	225	288
138	138			96	113	120	120	142	171	138	46	48	101	132
96	96			64	78	84	84	96	118	96	32	36	72	90
60	60			504	143	48	48	530	150	60	496	24	144	54
				19	3			19	2		49		3	
				48	22			47	20		48		22	
72	72			36	95	60	60	84	107	72	24	32	96	66
72	72			36	95	60	60	84	107	72	24	32	96	66
60	60			28	78	48	48	68	90	60	20	24	79	54
882	882	0	0	1093	951	744	744	1468	1249	882	869	332	906	816

Februari		Maret			
Minggu ke		Minggu ke			
3	4	1	2	3	4
66	38	53	24	42	37
288	160	101	0	294	245
132	72	44	0	132	110
90	50	31	0	90	75
54	484	105	54		453
	19	1			19
	47	10			46
66	20	92	72		
66	20	92	72		
54	16	74	54		
816	926	603	276	558	985

Tabel 4.4 Peta Kebutuhan Tukang Gali sebelum Diratakan


Jenis Pekerjaan	Durasi (hari)	Agu								
		Minggu ke 2						Mingg		
		Hari ke						Hari		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galian sumuran	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Galian DPT	8	13	13	13	13	13	13	13	13	
Galian pilecap, footplate, sloop	8									13
Galian bak sumpit dan saluran basement	12									14
Total (orang-hari)		31	31	31	31	31	31	31	31	45

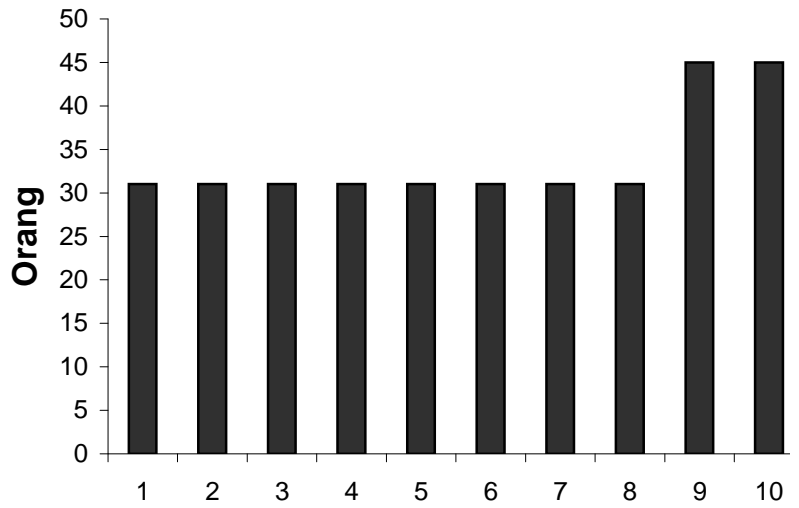


Keterangan:
 Float yang belum terpakai



Status										September								
Minggu ke 3			Minggu ke 4						Minggu ke 1				Minggu ke 2					
Hari ke			Hari ke						Hari ke				Hari ke					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	18	18	18	18	18	18	18	18										
13	13	13	13	13	13	13												
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14								
45	45	45	45	45	45	45	32	32	14	14								

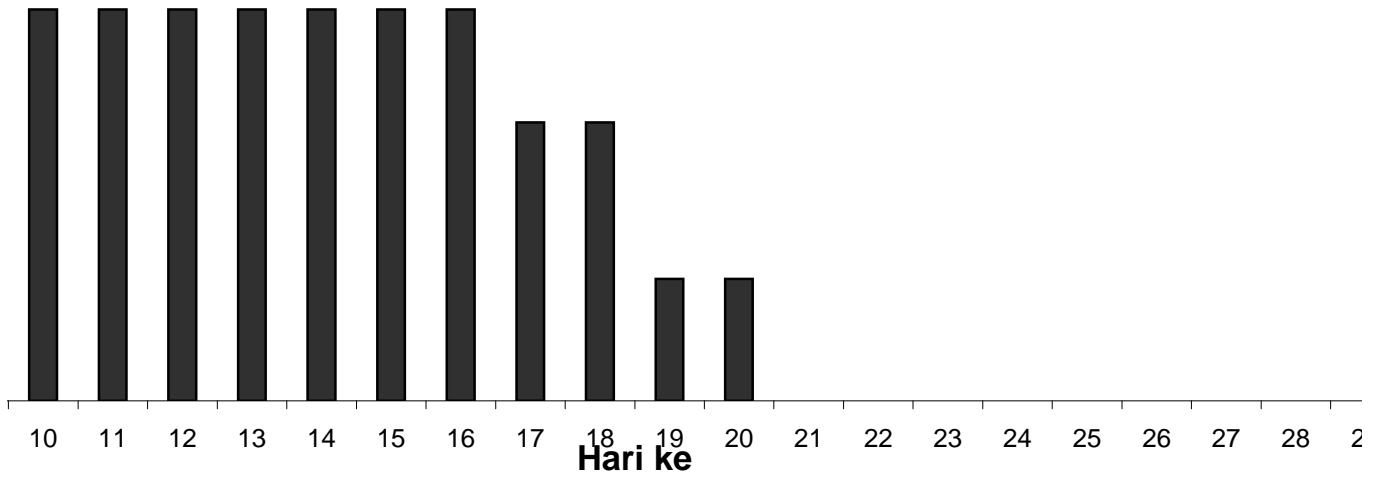


		Minggu ke 3					
		Hari ke					
29	30	31	32	33	34	35	36



Tabel 4.5 Peta Kebutuhan Tukang Gali Sesudah Diratakan (Alternatif Pertama)


Jenis Pekerjaan	Durasi (hari)	Agu								
		Minggu ke 2						Mingg		
		Hari ke						Hari		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galian sumuran	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Galian DPT	8	13	13	13	13	13	13	13	13	
Galian pilecap, footplate, sloop	8									13
Galian bak sumpit dan saluran basement	12									
Total (orang-hari)		31	31	31	31	31	31	31	31	31

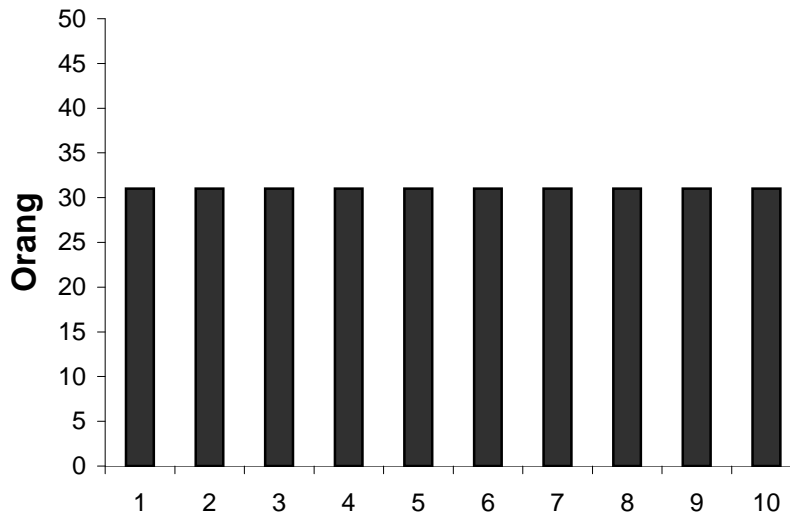


Keterangan:
 Float yang belum terpakai



Status									September									
Minggu ke 3			Minggu ke 4						Minggu ke 1						Minggu ke 2			
Hari ke			Hari ke						Hari ke						Hari ke			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	18	18	18	18	18	18	18	18										
13	13	13	13	13	13	13												
			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14				
31	31	31	45	45	45	45	32	32	14	14	14	14	14	14				

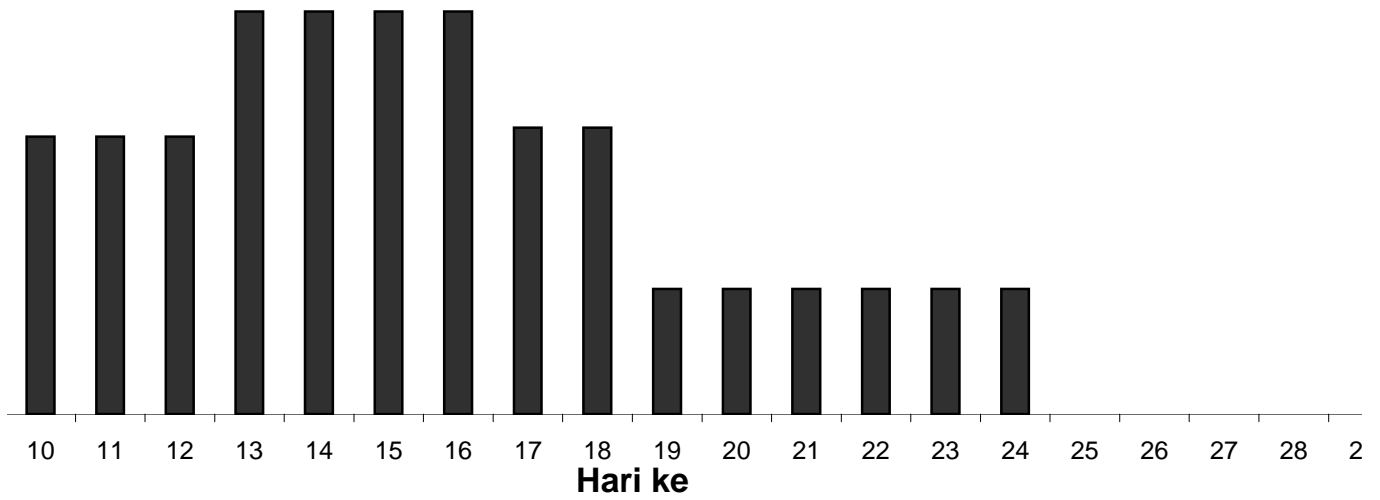


		Minggu ke 3					
		Hari ke					
29	30	31	32	33	34	35	36



Tabel 4.6 Peta Kebutuhan Tukang Gali Sesudah Diratakan (Alternatif Kedua)


Jenis Pekerjaan	Durasi (hari)	Agustus									
		Minggu ke 2					Minggu ke 3				
		Hari ke					Hari ke				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Galian sumuran	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
galian DPT	8	13	13	13	13	13	13	13	13		
galian pilecap, footplate, sloop	8									13	13
Galian bak sumpit dan saluran basement	12										
Total (orang-hari)		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

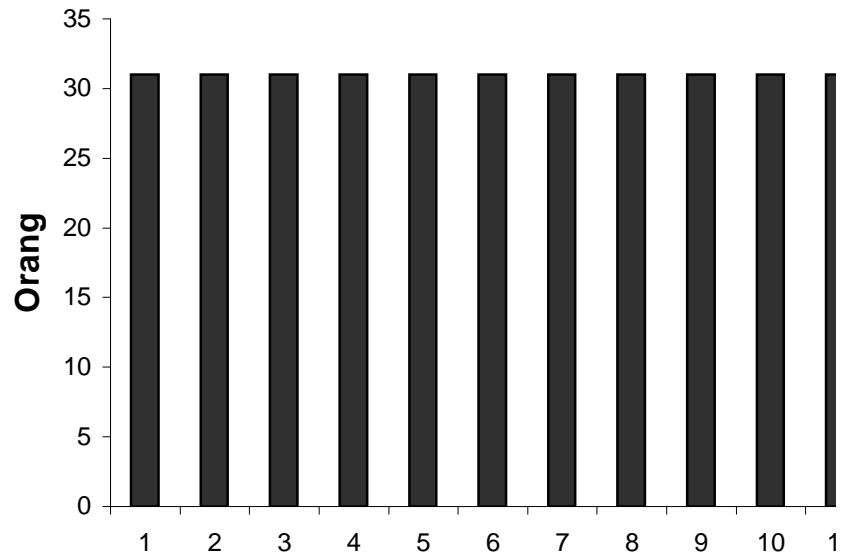

Keterangan:
 Float yang belum terpakai



								September										
Minggu ke 4								Minggu ke 1				Minggu ke 2						
Hari ke								Hari ke				Hari ke						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18	18	18	18	18	18	18	18											
13	13	13	13	13	13													
						14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
31	31	31	31	31	31	32	32	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	

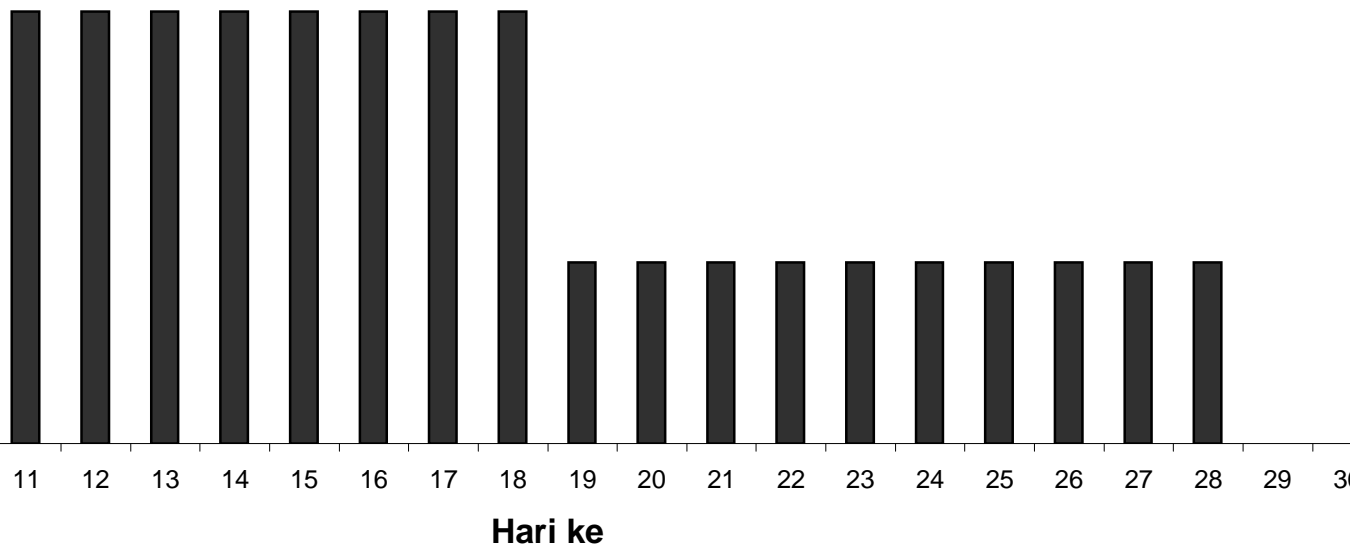

	Minggu ke 3					
	Hari ke					
30	31	32	33	34	35	36

30 31 32 33 34 35 36
